

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: Tejuco Solar

Proponente: Molde

Local: Tejuco e Monte Cristo, Brumadinho/MG

Responsável Técnico: Miliane Neto

Responsabilidade pela Visita: Miliane Neto

No dia 01 de junho de 2026 a equipe do Semente, representada por Miliane Neto e Jéssica Lobo, participou da visita técnica em Tejuco e Monte Cristo, distritos de Brumadinho/MG. O projeto teve início em 14 de julho de 2025, com previsão inicial de oito meses para execução, encontrando-se atualmente em andamento, com prorrogações devidamente solicitadas. A prorrogação consiste em beneficiar mais famílias contempladas com as placas solares.

O projeto tem como objetivo selecionar 26 residências para a instalação de painéis solares, com o intuito de reduzir os custos com energia elétrica e, ao mesmo tempo, oferecer uma fonte de energia limpa e renovável para as comunidades. Com a prorrogação, mais uma família foi contemplada.

A visita técnica teve início no período da manhã e se estendeu até à tarde. A equipe percorreu as comunidades, a fim de visitar as residências que tiveram as placas solares instaladas, para a entrega de cartilha orientadora quanto aos cuidados necessários para preservar o bom uso dos painéis solares.

Foram realizadas 32 visitas nos distritos de Tejuco e Monte Cristo, sendo 20 no primeiro e 12 no segundo. Em 21 residências, o material foi entregue pessoalmente aos moradores, enquanto nas 11 restantes, foi deixado na caixa de correio. Posteriormente, o proponente entrou em contato com os moradores que não foram encontrados durante as visitas, garantindo o repasse das informações e o esclarecimento de eventuais dúvidas.



Imagem 1. Visita nas residências com placas instaladas

Autoria: Miliane Neto
Data: 01/06/2026

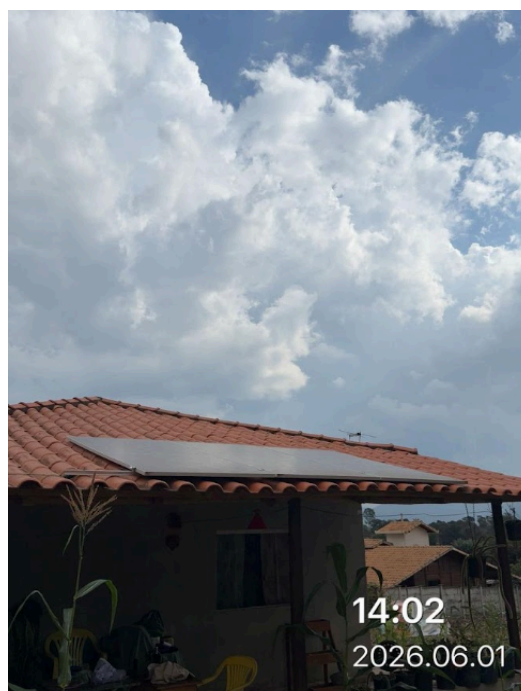


Imagem 2. Placas instaladas – telhado em residência

Autoria: Miliane Neto
Data: 01/06/2026



Imagem 3. Equipe proponente passando orientações

Autoria: Miliane Neto



Imagem 4. Entrega do folheto informativo em caixa de correio

Autoria: Miliane Neto

Data: 01/06/2026

Data: 01/06/2026



Imagem 5. Sistema fotovoltaico instalado –
placas

Autoria: Miliane Neto

Data: 01/06/2026



Imagem 6. Equipe proponente e equipe
Semente com beneficiário

Autoria: Jéssica Lobo

Data: 01/06/2026

O projeto está no penúltimo mês de execução e ao final da visita constatamos que as atividades estão sendo executadas conforme o previsto e satisfatoriamente recebidas pelos participantes. Os moradores que receberam os sistemas fotovoltaicos demonstraram grande satisfação com os resultados práticos obtidos, com considerável redução ou até mesmo abatimento integral das tarifas de energia elétrica.

12. Cronograma

Fases	Atividades	Período de execução (mês)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Edital	Desenvolvimento do edital com os pré-requisitos de seleção das famílias e a publicação do edital.	●	●	○	○	○	○	○	○
	Realização das inscrições para participação no projeto.	○	●	●	○	○	○	○	○
	Análise dos inscritos para seleção e publicação dos resultados.	○	●	●	○	○	○	○	○
Instalação dos sistemas fotovoltaicos	Verificação pela empresa contratada dos pré-requisitos de instalação nas casas dos beneficiados.	○	○	●	●	○	○	○	○
	Capacitação por parte da empresa contratada.	○	○	○	●	●	●	●	●
	Instalar os sistemas fotovoltaicos nas moradias.	○	○	○	●	●	●	●	●

Materiais produzidos	Período de execução (mês)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Posts para redes sociais	○	●	●	○	●	○	●	●
Cartilhas	●	●	○	○	○	○	○	○
Diárias de Carro de som	○	●	○	○	○	○	○	○
Folders	●	●	○	○	○	○	○	○
Cartazes	●	●	○	○	○	○	○	○

Sem mais,

Belo Horizonte, 22 de junho de 2026.
