

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

**Projeto:** Interligação do Anel Hidráulico

**Proponente:** Sociedade Ambiente Vivo

**Local:** Itabira - MG

**Responsável Técnico:** Eduardo Santos

**Responsável pela Visita:** Eduardo Santos

No dia 11 de maio de 2026, a equipe do Semente, representada por Thiago Souza e Eduardo Santos, participou da visita técnica ao município de Itabira, onde são realizadas as atividades do projeto *Interligação do Anel Hidráulico*. O projeto tem como objetivo realizar a ligação do anel hidráulico da cidade de Itabira a pontos de abastecimento, possibilitando a distribuição de água para a cidade e aumentando a resiliência do sistema de abastecimento.



*Imagem 1. Dra Giuliana Talamoni, equipe Sociedade Ambiente Vivo e equipe Plataforma Semente  
Autoria: Sociedade Ambiente Vivo  
Data: 11/05/2026*

O projeto, que se iniciou em 15 de julho de 2025, sofreu prorrogação devido ao atraso no fornecimento dos materiais (tubulações, conexões e acessórios) que são fabricados na China. Por conta do atraso na entrega dos materiais adquiridos pela empresa contratada para execução das obras, o projeto

que inicialmente seria executado em 12 (doze) meses, foi prorrogado por mais 90 (noventa) dias, totalizando 15 (quinze) meses, conforme solicitado pela instituição proponente por meio de ofício enviado à Plataforma Semente. Não tendo havido novas atividades, apenas dilação de prazo, deve-se considerar 3 meses adicionais no cronograma abaixo a partir do 9º mês de execução.

## 12. Cronograma

Fases	Atividades	Período de execução (mês)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Interligação do Anel Hidráulico Pureza ao Fênix	Mobilizar canteiro e equipe de obra	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Executar as escavação valas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Execução assentamento redes	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	reaterro e compactação de solo	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Realização a interligação da rede construída com a infraestrutura existente	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Realizar teste de comissionamentos das novas redes	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Recompor pavimentação asfáltica necessária	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●
Evento de Encerramento	Evento de encerramento e entrega da Obra a comunidade	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	Mobilizar canteiro e equipe de obra	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Interligação do Anel Hidráulico Areão ao Milhão	Executar as escavação valas	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Execução assentamento redes	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Reaterro e compactação de solo	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Realização a interligação da rede construída com a infraestrutura existente	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Realizar teste de comissionamentos das novas redes	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Recompor pavimentação asfáltica necessária	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Imagem 2. Cronograma original de execução do projeto*

*Autoria: Sociedade Ambiente Vivo*

*Data: 15/05/2025*

Seguindo o cronograma da visita, que aconteceu no 10º (décimo) mês de execução do projeto, foi realizada uma reunião na sede da instituição proponente para alinhamentos referente à execução, na qual foram apresentados registros

fotográficos das atividades executadas até o momento, dentre elas, mobilização e comunicação do projeto junto à comunidade local, o início das obras e os locais onde serão realizadas as interligações do anel hidráulico aos pontos de captação de água.

Após a apresentação, foram realizados alinhamentos quanto à apresentação das prestações de contas técnicas dos projetos junto à Plataforma Semente. Na data da reunião, já havia se passado a data de apresentação das duas primeiras prestações de contas técnicas parciais (15/11/2025 e 15/03/2026), cujos status seguem conforme abaixo:

- 1ª Prestação de Contas parcial – Em revisão devido à meios de verificações incompletos;
- 2ª Prestação de Contas parcial – Pendente de apresentação pelo proponente.

A equipe da Plataforma Semente reforçou a importância da apresentação das prestações de contas no sistema dentro das datas estabelecidas antes do início de execução do projeto. Também foi reforçada a necessidade de comunicar possíveis revisões necessárias no projeto, conforme orientado em reuniões anteriores entre a equipe da plataforma e da instituição proponente, para que o projeto não seja paralisado, de acordo com os termos presentes no regulamento e também no termo de compromisso assinado durante a contemplação do projeto.

Após a reunião, deu-se início à visita às obras, que foi realizada junto à promotora responsável pela contemplação do projeto, Dra. Giuliana Talamoni, e o representante técnico da instituição proponente, Amarildo Milano. O primeiro local da visita foi na Avenida Brasil, onde um trecho da tubulação já foi instalado, enquanto em outro trecho está sendo executada a escavação para instalação da tubulação (imagens 2 e 3).



*Imagem 3. Escavação para instalação de tubulação.*

*Autoria: Eduardo Santos*

*Data: 11/05/2026*

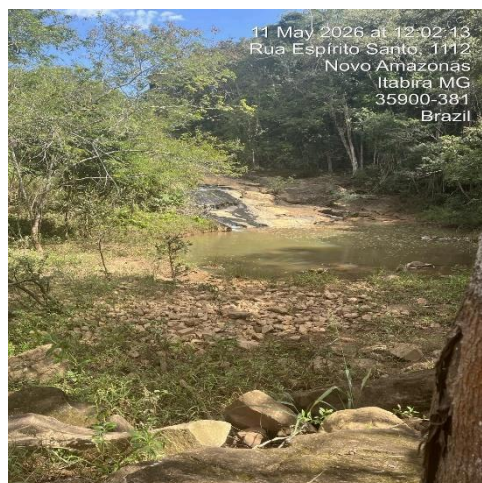


*Imagem 4. Escavação para instalação de tubulação.*

*Autoria: Eduardo Santos*

*Data: 11/05/2026*

Em seguida a equipe seguiu para um dos locais onde a tubulação se conectará a um ponto de abastecimento, localizado na Rua Espírito Santo (imagem 5). Dali, foi possível acompanhar as marcações dos locais onde serão realizadas as instalações.



*Imagem 5. Local de abastecimento onde a tubulação será conectada.*

*Autoria: Eduardo Santos*

*Data: 11/05/2026*

O último ponto da visita foi no pátio onde estão armazenados os materiais (tubulações, conexões e acessórios) para execução do projeto (imagens 6 e 7), localizado também na Rua Espírito Santo,



*Imagem 6. Tubulação no canteiro de armazenamento.*

*Autoria: Eduardo Santos*

*Data: 11/05/2026*



*Imagem 7. Conexões e acessórios no canteiro de armazenamento.*

*Autoria: Eduardo Santos*

*Data: 11/05/2026*

Ao final da visita, constatou-se que o projeto segue em execução conforme o cronograma de reprogramação autorizado no ofício enviado pela instituição proponente, e as atividades estão sendo executadas de forma satisfatória.

Sem mais,

Belo Horizonte, 27 de maio de 2026.

*Eduardo Felipe dos Santos*

# Trilha de auditoria

## Detalhes

NOME DO ARQUIVO      Relatório de Visita Técnica - Interligação do Anel Hidráulico.docx - 29/05/2026, 13:17

STATUS                      ● Assinado

CARIMBO DE DATA/HORA DO STATUS      2026/05/29  
16:18:20 UTC

## Atividade



ENVIADO

eduardo.santos@cemais.org.br **enviou** uma solicitação de assinatura para:

- Eduardo Felipe dos Santos (eduardo.santos@cemais.org.br)

2026/05/29  
16:17:45 UTC



ASSINADO

**Assinado** por Eduardo Felipe dos Santos (eduardo.santos@cemais.org.br)

2026/05/29  
16:18:20 UTC



CONCLUÍDO

Todos os signatários assinaram o documento e ele foi **concluído**

2026/05/29  
16:18:20 UTC

O endereço de e-mail indicado acima para cada signatário está associado a uma Conta do Google e pode ser o e-mail principal ou secundário.
