


## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

**Projetos:** RESTAURA – Igreja Matriz de Bom Sucesso e ILUMINA – Igreja Matriz de Bom Sucesso

**Proponente:** Agência de Desenvolvimento Regional Integrado - ADERI

**Responsável Técnico:** Francielle Ferreira

No dia 10 de março, a equipe do Semente, representada por Francielle Ferreira e Laissa Moura, bem como a equipe da Agência de Desenvolvimento Regional Integrado - ADERI, representada pelo gestor do contrato Carlos Barbosa bem como sua assistente Andreia Rosa, participaram da visita técnica ao município de Caeté para acompanhamento dos projetos *RESTAURA e ILUMINA – Igreja Matriz de Bom Sucesso*, contemplados no âmbito do Programa Minas Para Sempre.

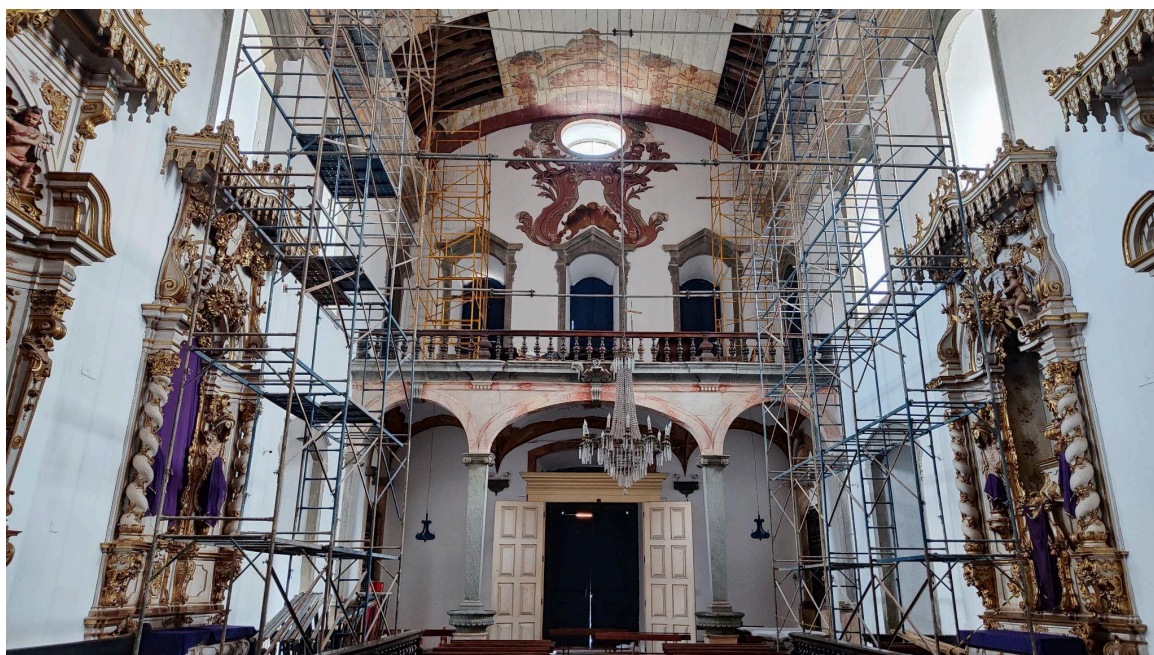

*Andamento das obras - Igreja Matriz de Bom Sucesso, em Caeté/MG.  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 10/03/2025*

O objetivo da visita, portanto, foi o acompanhamento da execução das propostas de intervenções previstas nos projetos submetidos e contemplados via Plataforma Semente, que contempla a execução dos seguintes serviços:

## RESTAURA – Igreja Matriz de Bom Sucesso:

### **Restauração forro da nave**

- Montagem de andaimes;
- Desmonte das tábuas do forro;
- Restauração das peças do forro: consolidação de suporte, emassamento e nivelamento, reintegração das cores;
- Remontagem das tábuas.

### **Restauração piso de campas da capela-mor, nave e átrio**

- Mapeamento e numeração das campas;
- Remoção das campas;
- Limpeza superficial, embalagem para transporte e transporte para o ateliê de restauro;
- Recuperação dos danos estruturais existentes;
- Imunização preventiva;
- Remoção da cera atual, aplicação de líquido selador, aplicação de cera líquida;
- Reinstalação das campas restauradas.

### **Restauração Retábulo**

- Higienização, imunização e desinfestação do suporte;
- Refixação de peças soltas, recomposição de áreas faltantes e consolidação do suporte e calafetação;
- Fixação da camada pictórica;
- Remoção mecânica e limpeza química;
- Revisão da fixação da camada pictórica;
- Emassamento e nivelamento de lacunas;
- Reintegração cromática, aplicação de nova camada de pintura em áreas de substituição do suporte;
- Aplicação de bolo armênio amarelo nos ornatos, frisos e cordões da parte inferior do retábulo;
- Aplicação de verniz de proteção.


### **Descupinização do suporte em madeira dos retábulos**

- Mapeamento de pontos de cupins;
- Descupinização.

ILUMINA – Igreja Matriz de Bom Sucesso:

- Infraestrutura das instalações elétricas e luminotécnicas, preparo de alvenarias, colocação de eletrodutos, conexões, caixas, etc;
- Instalação de interruptores e tomadas;
- Instalação de disjuntores e quadros;
- Instalação de luminárias, lâmpadas e reatores;
- Instalação de disjuntores e quadros;
- Infraestrutura preparada para receber as instalações de segurança eletrônica;
- Infraestrutura preparada para receber as instalações de som.


A visita foi guiada pelo gestor do contrato para análise das atividades em execução, bem como das etapas que já estão finalizadas. Das atividades previstas no projeto *RESTAURA - Igreja Matriz de Bom Sucesso*, os serviços de remoção das tábuas do forro da nave e restauração de trechos do piso deampa da igreja prosseguem sendo executados, conforme imagens abaixo:

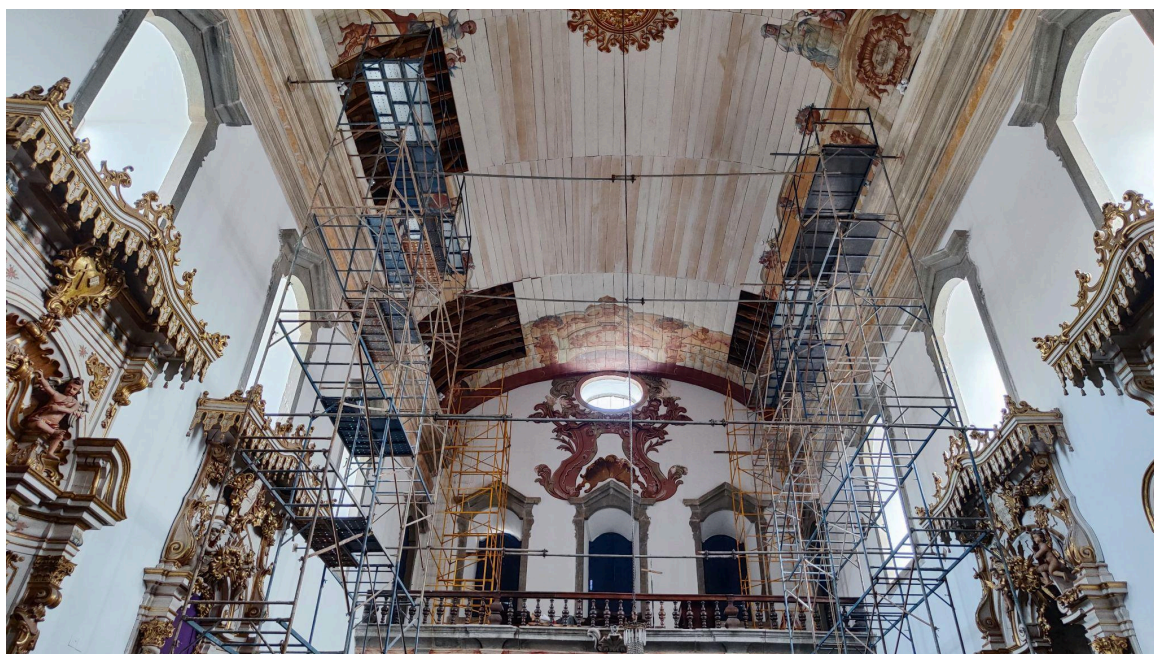


*Restauração do forro da nave*

*Autoria: Francielle Ferreira*

*Data: 10/03/2025*

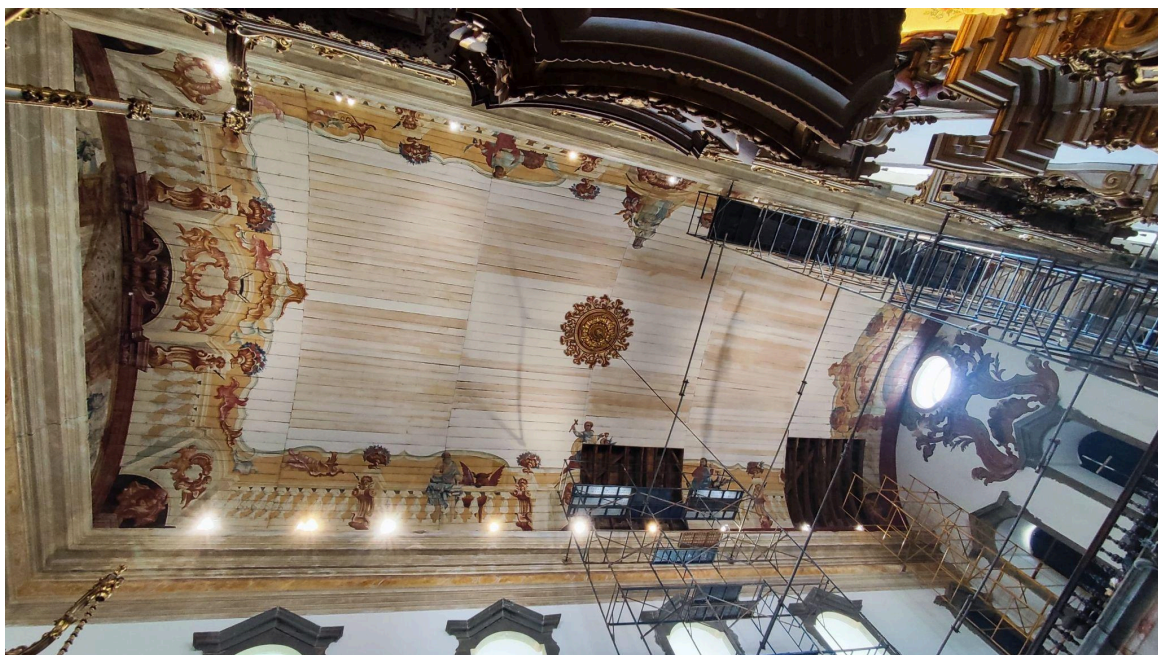

*Restauração do forro da nave  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 10/03/2025*

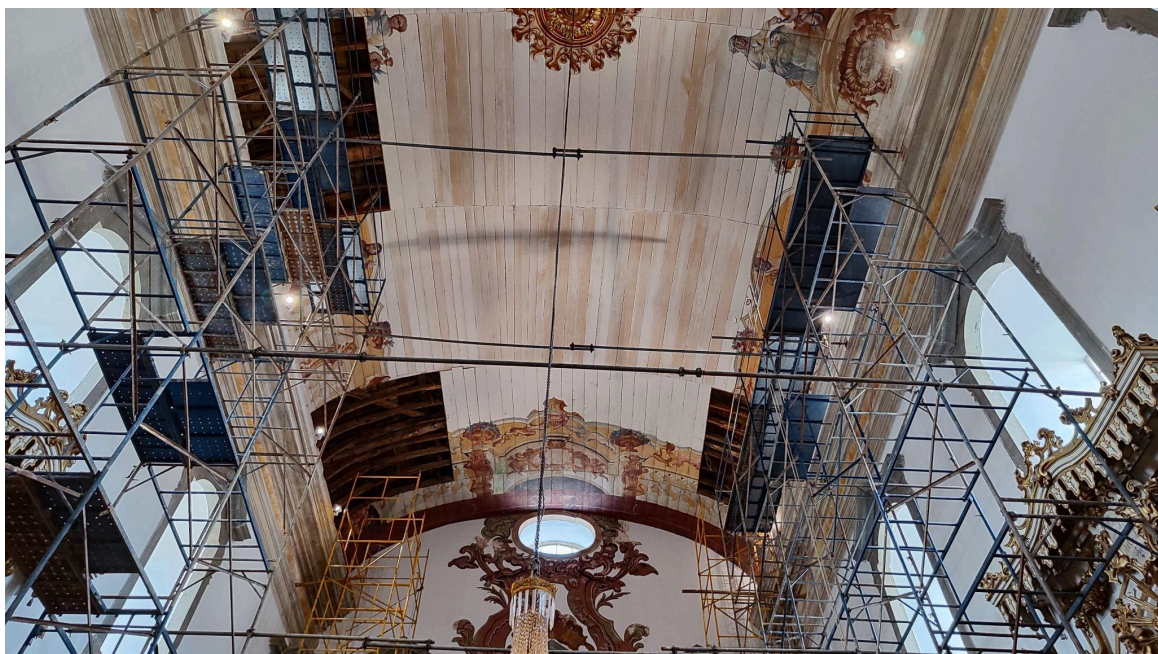


*Restauração do forro da nave  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 10/03/2025*

No que tange à restauração das tábuas do forro, os trabalhos seguem em andamento, mas um trecho de tábuas foi removido e encaminhado para o ateliê de restauro especializado contratado para a execução da intervenção.




*Restauração do forro da nave  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 10/03/2025*

Os serviços de recuperação e restauração do piso de campas da igreja seguem em estado avançado de execução. As campas restauradas foram reinstaladas em seu local de origem, conforme mapeamento prévio realizado. No momento presente, as peças de toda nave retornaram do ateliê de restauro, onde foram realizados os serviços de recuperação do suporte em madeira das campas, compreendendo a sua imunização, remoção das ceras aplicadas ao longo dos anos, consolidação e complementação do madeirame danificado e aplicação de cera.

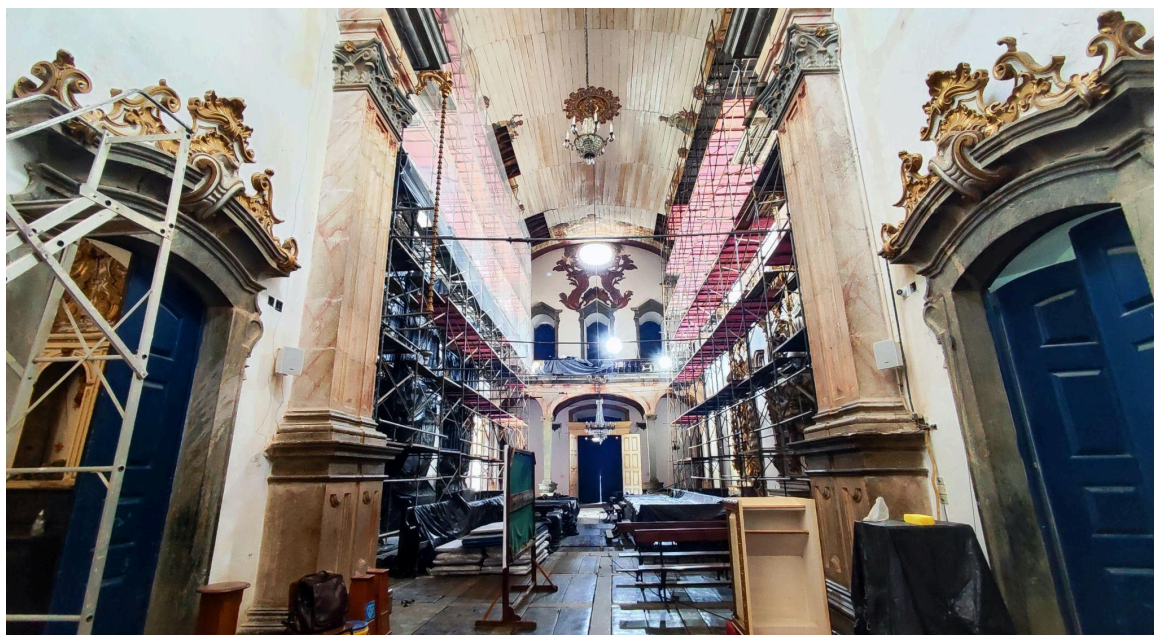


*Piso da nave - restauração das campos em processo*  
*Autoria: Francielle Ferreira*  
*Data: 10/03/2025*

Já em relação ao projeto *ILUMINA - Igreja Matriz de Bom Sucesso*, o serviço de execução de infraestrutura elétrica interna foi finalizado, tendo sido executadas as atividades de remoção do reboco e abertura dos pontos para instalação da tubulação elétrica na parte interna da edificação. O cabeamento e instalação das luminárias internas estão em avançado estado de execução, tendo sido instaladas as luminárias da sacristia, da nave e do batistério, conforme ilustram as imagens abaixo.

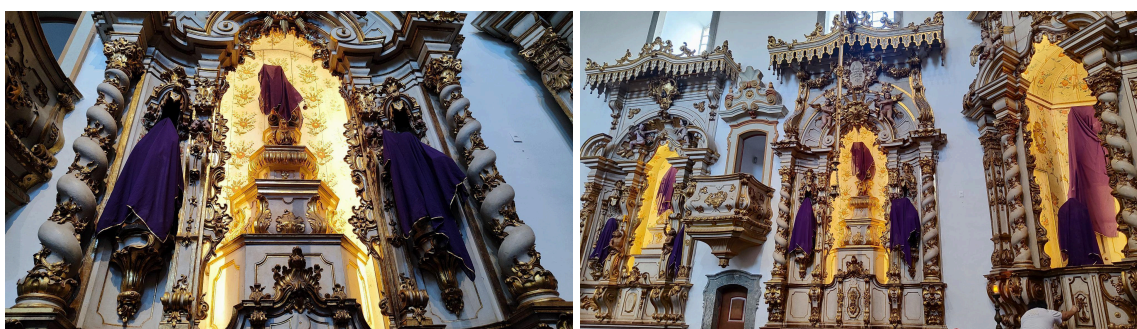


*Iluminação dos retábulos instalada e em funcionamento*  
*Autoria: Francielle Ferreira*  
*Data: 10/03/2025*

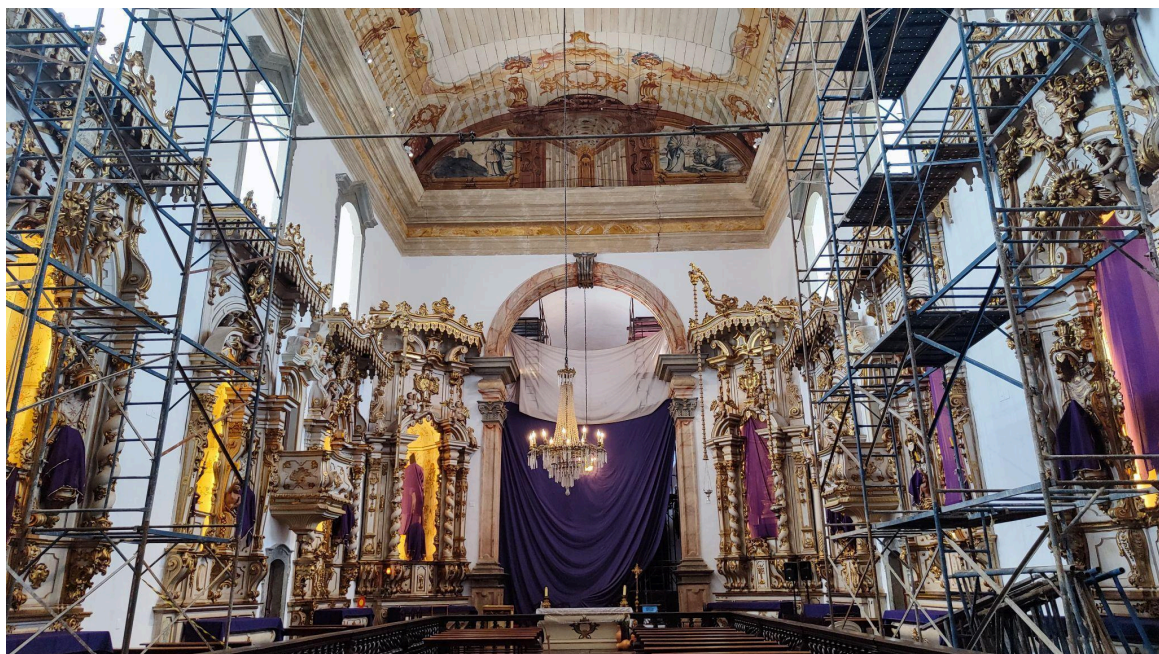

*Iluminação e pintura da nave em avançado estágio de execução*

*Autoria: Francielle Ferreira*

*Data: 10/03/2025*

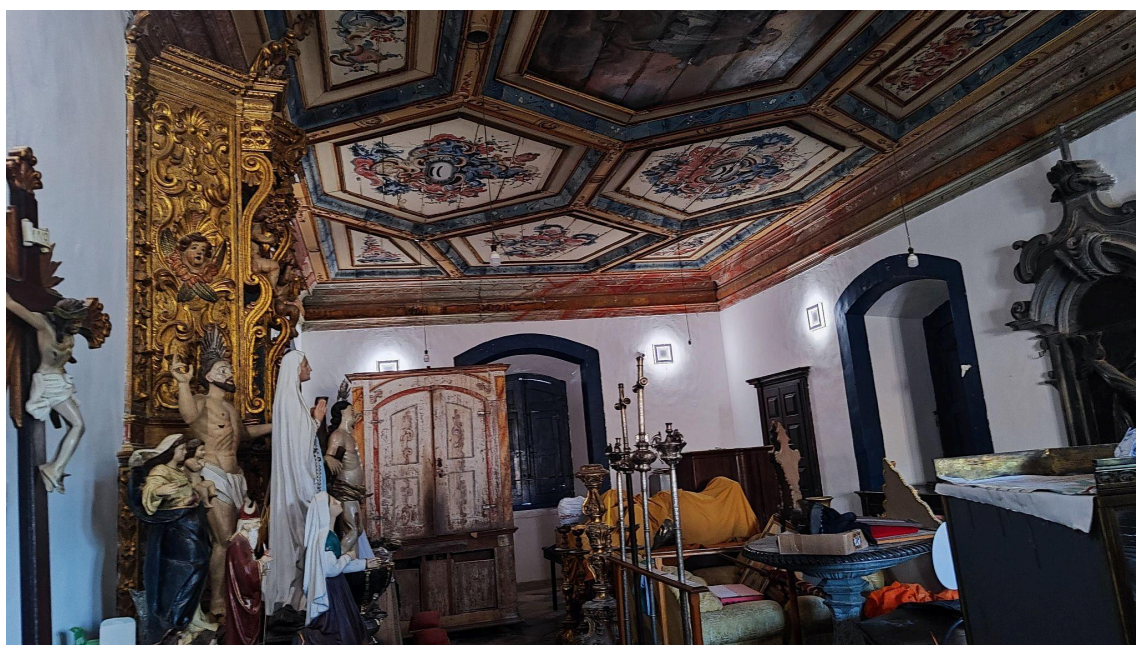

*Iluminação e pintura da sacristia concluída*

*Autoria: Francielle Ferreira*

*Data: 10/03/2025*



*Iluminação e pintura do consistório concluída  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 10/03/2025*



*Iluminação e pintura da nave em avançado estágio de execução  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 10/03/2025*



*Iluminação dos retábulos colaterais da nave concluídas*

*Autoria: Francielle Ferreira*

*Data: 10/03/2025*



*Pintura das alvenarias internas da capela mor em execução*

*Autoria: Francielle Ferreira*

*Data: 10/03/2025*



*Teste de tonalidade da pintura mineral a ser aplicada nos elementos emoldurados (cimalha e enquadramentos) da fachada frontal  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 10/03/2025*

Ao final, foi realizada uma reunião com representantes da Arquidiocese, da empresa contratada e da paróquia de modo a definir o andamento da obra, tendo em vista que o projeto encontra-se paralisado. Ainda assim, durante a visita, foi verificado pela equipe multidisciplinar da Plataforma Semente que a equipe da empresa contratada pelo projeto Ilumina estava mobilizada no canteiro. O proponente afirmou que os custos destes dias mobilizados seriam arcados pela paróquia.

Por último, foi solicitado ao proponente que sejam regularizadas formalmente junto a Plataforma Semente todas as pendências referentes às adequações orçamentárias dos projetos, a fim de retomar seu andamento.

Sem mais,

Belo Horizonte, 14 de abril de 2025.
