

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: Projeto e Implantação do Parque Ciliar Malheiro em Sabará/MG

Proponente: Instituto Plantando

Local: Sabará/MG

Responsável Técnico: Carolina Rodrigues Bordignon

Responsáveis Técnicos pela Visita: Carolina Rodrigues Bordignon e Mariana Lobo Silva

No dia 17 de setembro de 2026, a equipe técnica da Plataforma Semente, representada por Carolina Rodrigues Bordignon e Mariana Lobo Silva, realizou visita de monitoramento ao “Projeto e Implantação do Parque Ciliar Malheiro em Sabará/MG”, no município de Sabará/MG. O objetivo principal do projeto é implantar um parque ciliar comunitário na foz do córrego Malheiros com o rio das Velhas, com foco na melhoria da qualidade socioambiental e na redução dos riscos climáticos para a população ribeirinha vulnerável. O Plano de Trabalho da iniciativa pode ser acessado em: [Projeto e Implantação do Parque Ciliar Malheiro em Sabará](#).

Um parque ciliar é uma área destinada à proteção e recuperação da vegetação às margens de cursos d’água, com o intuito de conservar os recursos hídricos e reduzir processos erosivos, contribuindo com a proteção do solo e da biodiversidade. Além da função ecológica, esses espaços também podem ser planejados para promover lazer, educação ambiental e integração da comunidade com o ambiente natural.

A visita teve como objetivo acompanhar o andamento das ações executadas em campo, conhecer as áreas já contempladas e aquelas ainda em processo de negociação com os moradores, compreender a participação da população e acompanhar a articulação entre a equipe executora, o poder público e as demais instituições envolvidas no projeto.

A atividade teve início com uma reunião de alinhamento, que contou com a participação de representantes do Instituto Plantando, da COPASA, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sabará, de um dos Subcomitês vinculados ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) e da equipe da Plataforma Semente.





Reunião inicial com membros de interesse do projeto

Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon

Data: 17/09/2026

Durante a reunião, foram discutidos o andamento do projeto, os principais problemas socioambientais da região e a participação da comunidade. Conforme relatado pela equipe executora, os moradores vêm demonstrando adesão às ações e vários proprietários já autorizaram ou disponibilizaram parcelas de seus terrenos para viabilizar as intervenções previstas. Também foram mencionados problemas recorrentes relacionados ao descarte irregular de resíduos e ao lançamento de esgoto a céu aberto, situações que reforçam a necessidade de recuperação ambiental das margens do córrego Malheiros.

Foi visto, ainda, que a equipe mantém diálogo com a COPASA e com o poder público municipal a respeito das intervenções de saneamento e das futuras ações no território, buscando compatibilizar as obras previstas e evitar conflitos com as áreas destinadas à implantação e consolidação do parque ciliar. Essa articulação é particularmente relevante em razão da proximidade das intervenções com áreas residenciais e com trechos nos quais ainda existem passivos de saneamento.

Após a reunião, a equipe iniciou o percurso de campo por trechos já objeto de intervenção. Foram observadas áreas anteriormente utilizadas para descarte de lixo e entulho que passaram por limpeza e cercamento, reduzindo a exposição da população a situações de

risco. Conforme informado durante a visita, esses locais apresentavam acúmulo de resíduos e favoreciam a presença de animais peçonhentos, com maior risco para crianças, idosos e demais moradores que circulam pela região.



Área já limpa e cercada, pertencente a um morador
Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon
Data: 17/09/2026



Placa de aviso à população colocada após a limpeza da área
Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon
Data: 17/09/2026

Em alguns trechos já recuperados, verificou-se a presença de mudas de árvores nativas e espécies frutíferas em desenvolvimento, algumas já produzindo, como foi o caso das amoreiras e de um abacateiro. No espaço visitado, foi relatado que um morador optou por não utilizar parte do terreno para construção, como objetivava antes, e disponibilizou o espaço para a intervenção ambiental. Esse tipo de adesão comunitária contribui diretamente para a ampliação da área recuperada e para a continuidade territorial das ações do parque ciliar.



Mudas em crescimento em área cercada
Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon
Data: 17/09/2026

Durante o percurso, foi observada uma caçamba contendo grande volume de resíduos retirados da área. Segundo informado pela equipe local, o material correspondia a aproximadamente um dia de coleta, evidenciando a quantidade significativa de resíduos ainda presentes ou descartados irregularmente no entorno do córrego. A situação demonstra que, embora haja avanços nas ações de limpeza, a permanência dos resultados dependerá de acompanhamento contínuo, educação ambiental e articulação com os serviços públicos de coleta e fiscalização.




Caçamba com resíduos de um único dia de coleta

Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon

Data: 17/09/2026

A equipe também visitou uma área de propriedade municipal que, conforme informado, não integrava originalmente o recorte principal da intervenção, mas vem sendo recuperada em articulação com a Prefeitura. No local, foi relatada a intenção de ampliar a cobertura vegetal com plantio de espécies frutíferas e nativas e aproveitar o espaço para futura área de convivência. A visita permitiu observar, ainda, outros trechos em diferentes estágios de recuperação, incluindo um antigo lote vago em processo de revegetação e uma área anteriormente marcada pelo acúmulo de lixo que já apresentava preparação do solo e introdução de cobertura vegetal.

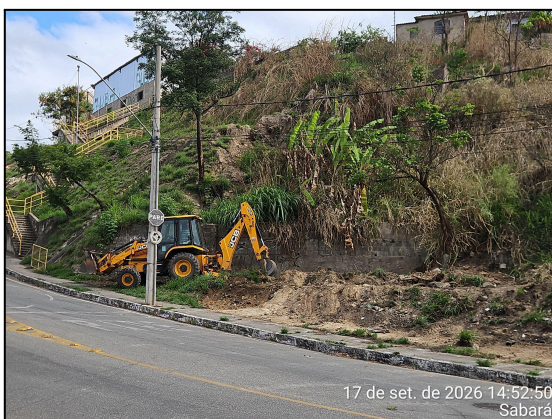

Propriedades municipais em processo de recuperação

Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon

Data: 17/09/2026



31 3643 7604



semente@cemais.org.br



sementemg.org

CeMAIS - 08.415.255/0001-27

Apesar dos avanços, foram identificados locais que ainda apresentam condições críticas. Em um dos trechos situados nos fundos de residências, observou-se lançamento de esgoto a céu aberto. A existência desse passivo sanitário deve permanecer como ponto de atenção, especialmente por se tratar de área onde serão realizadas as intervenções de recuperação ambiental. O tratamento desse problema depende de articulação com os órgãos e concessionárias competentes, não devendo as ações paisagísticas e de recomposição vegetal serem analisadas de forma isolada das condições de saneamento existentes.



Passivo sanitário em área das intervenções do projeto
Autoria: Instituto Plantando
Data: 17/09/2026

Ao longo do percurso, foram apresentados planos de integração entre diferentes áreas do parque, incluindo a criação ou melhoria de trilhas e acessos para conectar trechos atualmente descontínuos. Próximo a uma ponte, foi indicada a possibilidade de abertura de passagem para alcançar outra área prevista para revitalização. A equipe explicou que pretende melhorar a circulação entre os espaços recuperados e aproveitar áreas com potencial para convivência comunitária, sempre observando as condições do terreno e as autorizações necessárias.



Área do córrego que receberá trilha, entre outras intervenções

Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon

Data: 17/09/2026

Ao longo de todo o percurso, Fernando, responsável pela instituição proponente, foi indicando à representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente exemplares de leucena (*Leucaena leucocephala*) presentes nas áreas visitadas, para que fossem registrados visando à sua posterior supressão. A leucena é uma espécie exótica invasora, com elevada capacidade de dispersão e competição com a vegetação nativa. A retirada desses indivíduos tem como objetivo favorecer a recuperação da vegetação local, possibilitando sua substituição por espécies nativas e contribuindo para a recomposição e maior diversidade da vegetação ciliar.



Leucenas às margens do córrego Malheiros

Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon

Data: 17/09/2026



31 3643 7604



semente@cemais.org.br



sementemg.org

CeMAIS - 08.415.255/0001-27

A visita alcançou também a região de encontro entre o ribeirão Arrudas, o córrego Malheiros e o rio das Velhas. Nesse ponto, foram discutidas possibilidades de intervenção em parceria com o poder público para preparar a área para plantio, melhorar o acesso às margens e qualificar o espaço. Durante a observação do local, a equipe executora mencionou ideias futuras de valorização do trecho, ainda em caráter preliminar e dependentes de estudos e autorizações específicas.



Encontro do córrego Malheiros, Ribeirão Arrudas e Rio das Velhas
Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon
Data: 17/09/2026

Na etapa final do percurso, a equipe percorreu por trechos das margens do córrego nos quais serão realizadas as intervenções previstas no projeto. Conforme relatado, parte significativa das áreas particulares já conta com autorização ou cessão dos moradores, enquanto outras permanecem em negociação. Foi apresentada, ainda, a intenção de conectar uma futura trilha a uma praça já existente, ampliando a integração dos espaços públicos e a possibilidade de uso comunitário do parque.

De forma geral, a visita permitiu verificar avanços concretos na mobilização dos moradores e na recuperação inicial de diferentes trechos da microbacia do córrego Malheiros. Foram observadas áreas já limpas e cercadas, espaços com vegetação em desenvolvimento, terrenos em preparação para revegetação e iniciativas de integração entre áreas públicas e particulares. As intervenções observadas apresentam aderência às atividades previstas de limpeza, recomposição vegetal, cercamento, mobilização comunitária e preparação das áreas para implantação do Parque Ciliar.

As constatações de campo também evidenciaram desafios relevantes. O volume de resíduos ainda encontrado nas margens e a existência de trechos com lançamento de esgoto a céu aberto indicam que a recuperação ambiental deverá ser acompanhada por ações permanentes de educação ambiental, mobilização, monitoramento e articulação institucional. A continuidade do diálogo com a Prefeitura, COPASA e demais instituições envolvidas será importante para compatibilizar as ações ambientais com as necessidades de saneamento e infraestrutura existentes no território.



Equipe reunida durante a visita
Autoria: Ancelmo
Data: 17/09/2026

O projeto está entrando no sexto mês de execução. Durante a visita de monitoramento e reunião de alinhamento, constatou-se que as atividades propostas estão sendo desenvolvidas conforme proposto. Ainda, o projeto recebeu um aditivo no valor de R\$ 118.720,27, o qual permitirá a adição de 6 (seis) meses, com o objetivo de realizar ao final do projeto a manutenção das áreas plantadas, prevendo o monitoramento das áreas implantadas, manutenção, coroamento, irrigação, combate a formigas e demais cuidados necessários e, ainda, reposição de mudas e replantio

A Imagem abaixo apresenta o cronograma inicialmente aprovado, do qual, em suma, foi executado até o momento:

- Cadastro e diagnóstico socioambiental de 160 moradores do entorno do Córrego Malheiro - por meio de visitas técnicas e aplicação de questionário socioambiental;
- Elaboração de um pré-projeto contendo PTRF (Projeto Técnico de Reconstituição da Flora);
- Uma reunião geral para apresentação do projeto aos moradores, junto a reuniões individuais;
- Ajustes do PTRF após sugestões e alinhamentos com os moradores - em andamento;
- Uma apresentação em reunião semestral informativa com o SCBH Caeté-Sabará para esclarecimento de metas e prioridades do projeto;
- Três dias de oficinas de educação ambiental, abrangendo aproximadamente 3.600 alunos da rede pública de Sabará;
- Coleta, beneficiamento e armazenamento de sementes - atividade contínua, em andamento;
- Produção de aproximadamente 3.000 mudas nativas e frutíferas no viveiro.
- Plantio de aproximadamente 20 mudas em aproximadamente 80m²- o plantio foi iniciado na semana anterior à visita, correspondendo à etapa inicial desta atividade.

Fases	Atividades	Período de execução (mês)																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Diagnóstico Participativo	Estudos e pesquisas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Projeto de intervenção	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	Mobilização, reuniões e alinhamentos	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	Reuniões e audiências públicas	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	□	■	□	□	□	□	□	□
	Capacitações de parceiros	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	□	■	□	□	■	□	□	■
	Avaliação e visitas em áreas intervindas	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	■
Licenciamento Ambiental	Elaboração do PTRF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□
	Apresentação do PTRF a Comunidade	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	□	■	□	□	□	□	□	□
	Aprovação do PTRF	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	Apresentação do PTRF aprovado	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□
	Coleta de sementes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
Implantação do Parque	Produção de mudas nativas e frutíferas	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Plantio de mudas nativas e frutíferas	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
	Implantação da Área de Convivência	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■
	Implantação do Parque Ciliar	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Inauguração e Avaliação	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■

A visita evidenciou, portanto, a materialização de parte relevante das ações previstas e a importância da participação comunitária para a viabilidade territorial do projeto. Os locais visitados demonstram evolução significativa da limpeza e conservação da área, garantindo uma melhora na qualidade de vida da população.

Sem mais,

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2026.



31 3643 7604



semente@cemais.org.br



sementemg.org

CeMAIS - 08.415.255/0001-27

Anexo I

Transporte - Documento locação de veículo, Uber e combustível

Anexo II

Documento solicitação de diária

Documento assinado digitalmente
 **CAROLINA RODRIGUES BORDIGNON**
Data: 29/09/2026 08:56:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>
